


◆ 7 前半月の建設工事の状況

◇ 保育室にフローリングが施工されました。
壁のクロス貼りも始まりました。

保育室～以上児

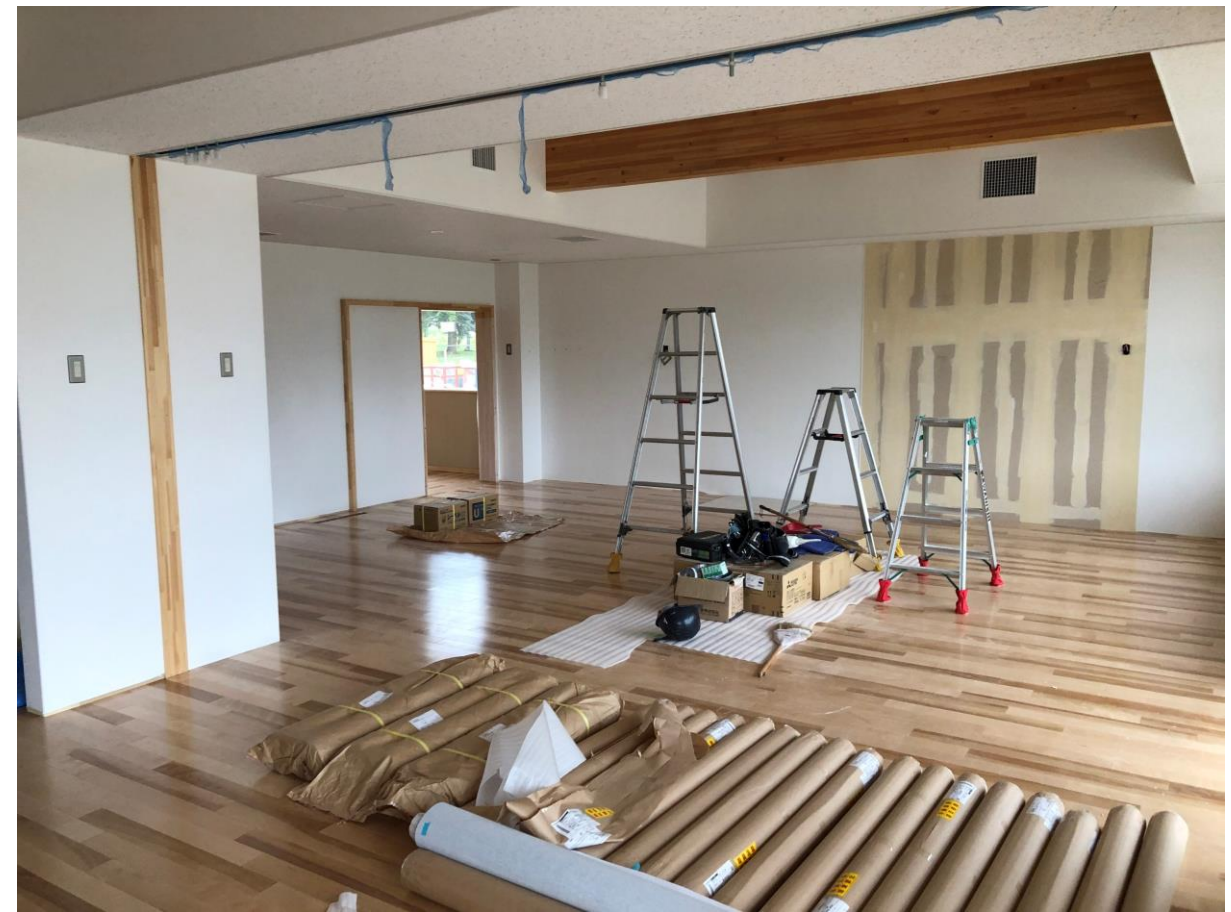

保育室～未満児

◇1、2才児クラスです。



◇可動式の戸が設置されるので仕切ることも可能です。



◇0才児クラスです。




◇子育て支援室です。



お遊戯室


◇職人技であっという間にフローリングが貼られていきます。

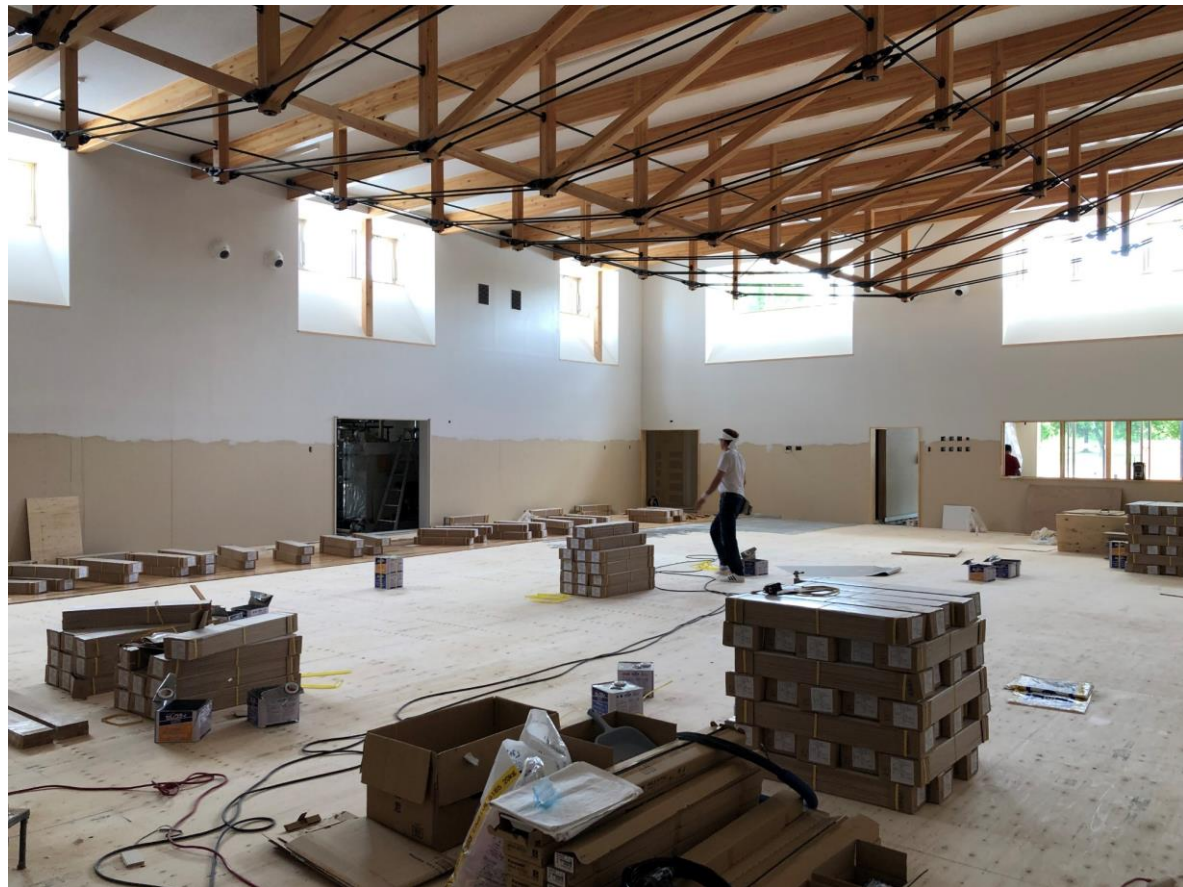

◇ステージは3段で、こどもが登りやすい形状です。



ホール ◇円の部分は本棚が設置され図書コーナーとなります。ホールはお遊戯室と同じ天井高で開放的な空間です。

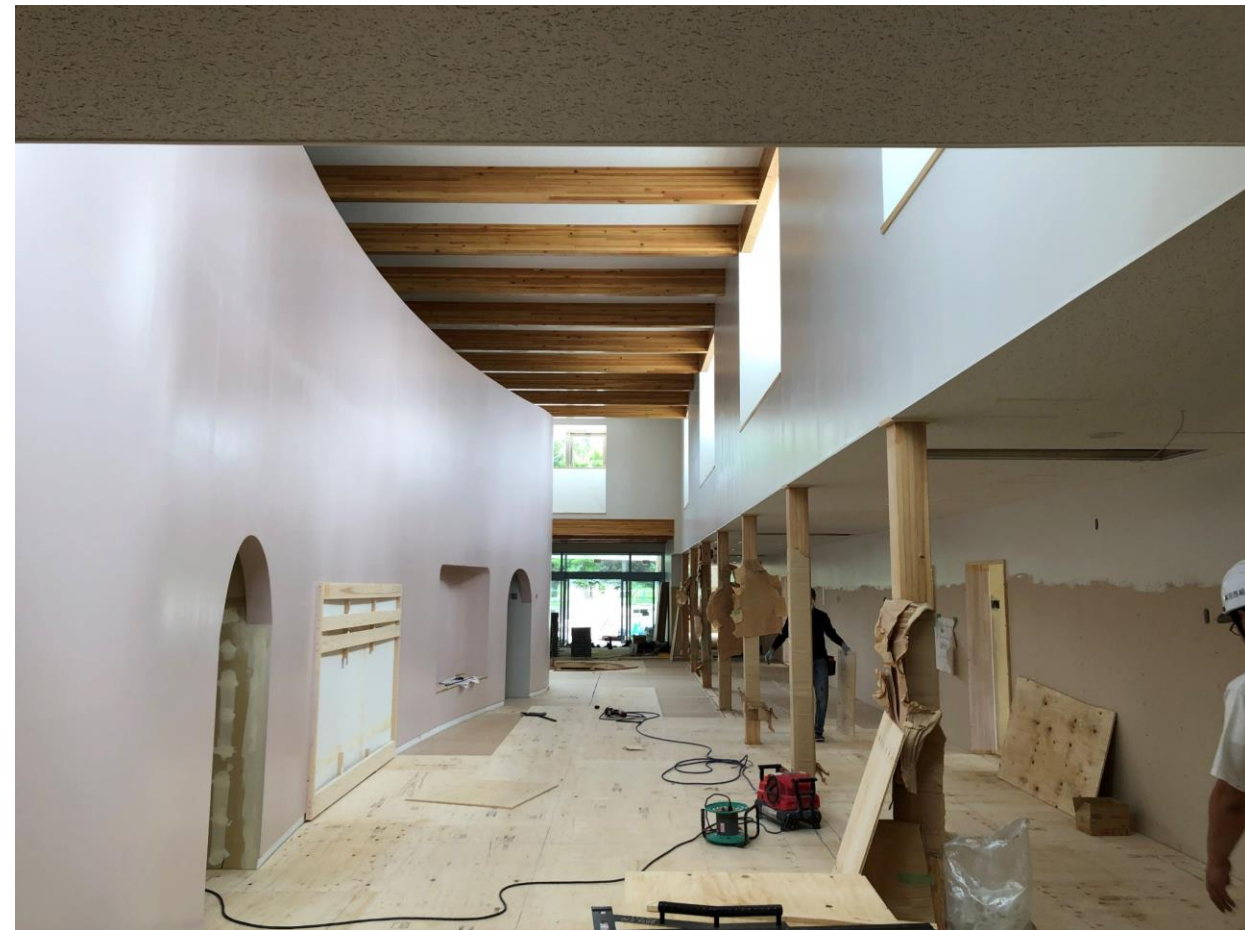

事務室

◇床は電源位置を調整できるOAフロアです。

◇施工前



◇施工後



プレイルーム

◇プレイルームも出来てきました。



◇天井についているのは防犯カメラです



トイレ

◇こども用便器です。縦付で設置されます。



◇大人用トイレです。仕切りは設置されます



玄関前

◇玄関前の外構も進められています。



園庭

◇園庭に芝生が貼られています



◇園の先生たちが見学に来ました。土管の中を通過しています。



◇楽しそうです。



外構工事

◇めっちゃ館西側の木を伐採します。



◇伐採後



◇駐車場整備も始まりました。

